


～ 竣工特集 ～  
**文化会館屋上受変電設備更新工事**

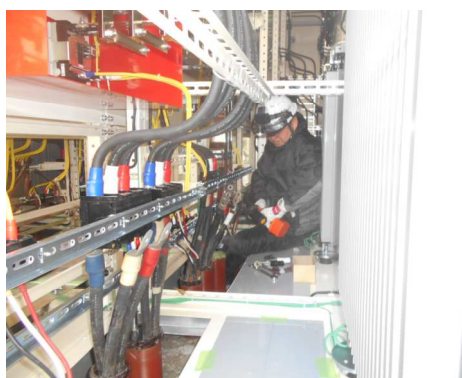

工 事 名 : 文化会館屋上変電設備更新工事

工事場所 : 三郷市早稲田五丁目4番地1

工 期 : 平成30年10月22日から平成31年 3月15日まで

工事概要 : 三郷市文化会館の屋上に設置されている変電設備の更新並びに更新工事に伴う停電期間中の仮設電源工事

既設変電設備撤去・新設変電設備設置は、駐車場に100tクレーンを配備して行う

仮設電源工事は仮設引込柱を建柱して東京電力の電柱から引込み、建物内に仮設分電盤を設置し各部署へ仮設電源ケーブルにて電気の供給を行う

新設変電設備への電気供給停止・復電作業は、関東電気保安協会の電気保安技術者にて行う

また、復電前の絶縁耐圧試験・接地抵抗測定、復電後の検電・検相も併せて関東電気保安協会にて行う

撤去した変電設備のトランス及び進相コンデンサー内部の油にPCB含有しているか否かの調査を行い、産業廃棄処理を行う



# 新電気新聞

第73号  
 発行者  
 営業部 中村美紀

創業四一年信頼と実績  
**株式会社 新電気**  
 〒330-0488 埼玉県三郷市早稲田4-7-19  
 F 電話 0488-9588-3777  
 A X 0488-9588-7771

